

1. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación se relacionan todos los trabajos realizados por **3RS GESTIÓN** para el Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria y el Mantenimiento de las Zonas Verdes de la entidad urbanística “Hacienda del Álamo Golf Resort”, en el mes **JUNIO 2026**.

1.1. TRABAJOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Resolución de ACTO VANDÁLICO por el que desaparecen los precintos y cartelería de los buzones de selectiva frente al aparcamiento subterráneo de Pueblo Español. Se informa a la EUC.



Antes



Después

A petición de la EUC y con motivo de las Fiestas de Pueblo Español que se celebraron del 6 al 9 de junio, se colocan 4 contenedores de fracción resto de 800L adicionales, además de isla de selectiva compuesta por 3 contenedores de envases + cartón + vidrio.



Tras la finalización de las Fiestas de Pueblo Español y a petición de la EUC, se decide dejar fija la isla de selectiva de 3 contenedores (envases + cartón + vidrio) en el parking trasero y 2 contenedores de fracción resto de 800L adicionales (en C/ Mojácar y en el Parking de entrada).





1.2. TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA

A petición de la EUC y con motivo de las Fiestas de Pueblo Español que se celebraron del 6 al 9 de junio, se realizaron una serie de servicios de limpieza adicionales consistentes en:



PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS DE RSU Y LIMPEZA VIARIA FIESTAS PUEBLO ESPAÑOL				
JUNIO 2026	VIERNES 5	SÁBADO 6	DOMINGO 7	LUNES 8
BRIGADA 01	RECOGIDA ORDINARIA RSU	RECOGIDA EXTRA-ORDINARIA RSU	RECOGIDA EXTRA-ORDINARIA RSU	RECOGIDA ORDINARIA RSU
BRIGADA 02	LIMPIEZA PLAZAS Y PAPELERAS		LIMPIEZA PLAZAS, PAPELERAS Y LIMPIEZA ZONA CARPA (INT. Y EXT.)	LIMPIEZA PLAZAS, PAPELERAS Y LIMPIEZA ZONA CARPA (INT. Y EXT.)







1.3. TRABAJOS DE JARDINERÍA

Recorte de seto y ficus de alineación, desbroce y limpieza del Vial Principal, desde rotonda Fase 1 hasta Rotonda Grava Negra

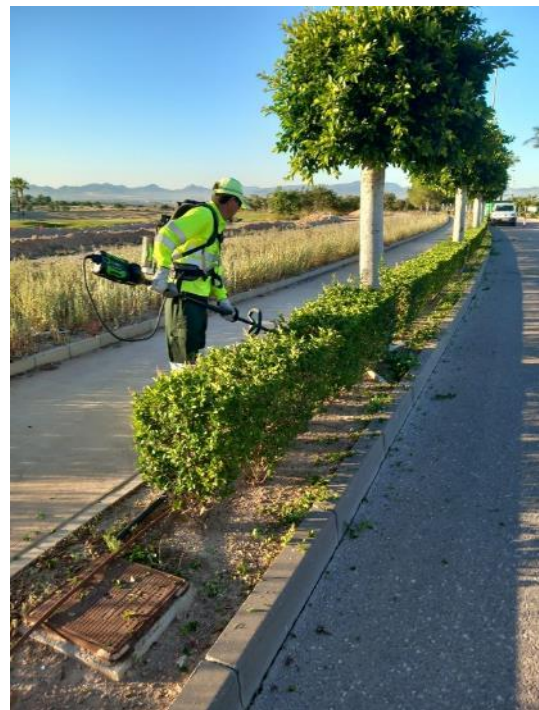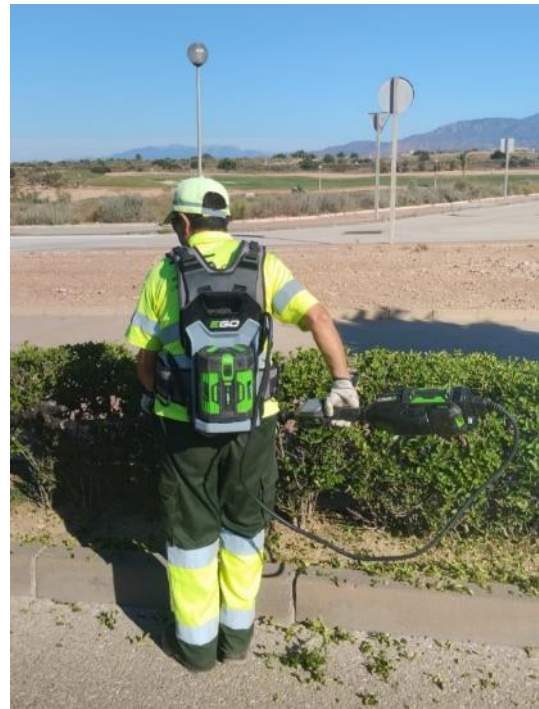

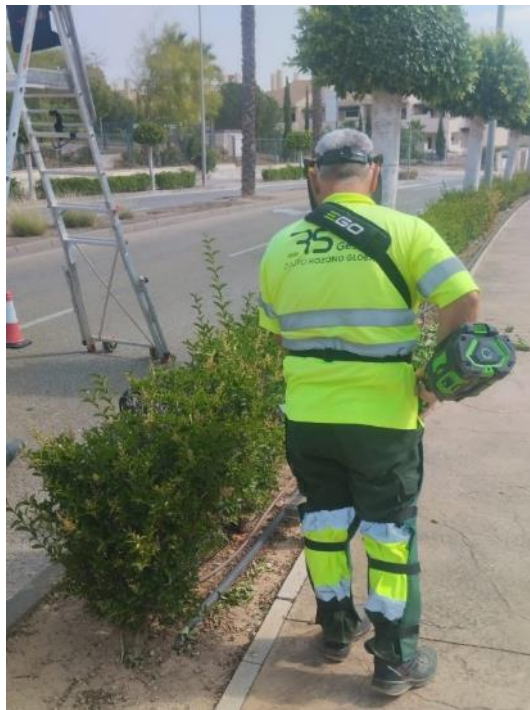



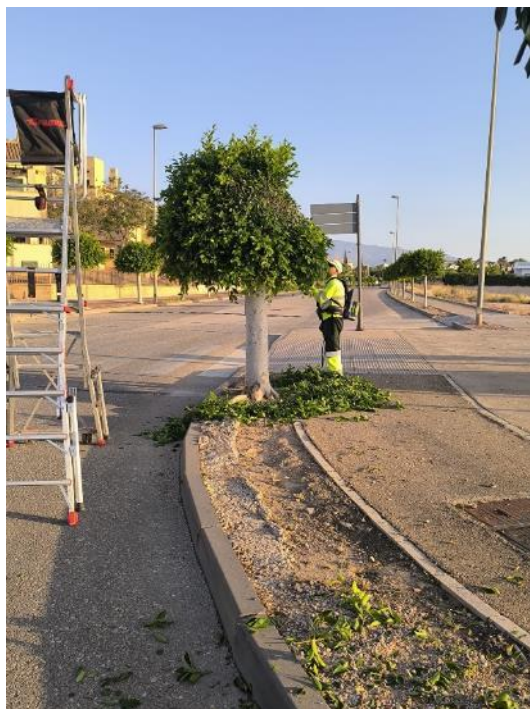

Recorte de seto y ficus de alineación, desbroce y limpieza en las calles interiores y aceras de las Fases 2-3







Recorte de seto y ficus de alineación, desbroce y limpieza en Paseo Alameda de la Fase 7 Oasis





Recorte de seto y ficus de alineación, desbroce y limpieza en vial de entrada a Pueblo Español (C/ Calabardina)



Recorte de setos, desbroce y limpieza del parque junto al EUM



Siega de césped de la entrada, el jardín por cuadros, la rotonda de la entrada, rotonda de la Fase 6 y rotonda de la Fase 1





Nueva plantación de flor en la rotonda de entrada. Retirada de planta seca existente, aporte de materia orgánica, entrecavado y nueva plantación de primavera compuesta de Tagete color mix naranja /amarillo





Vaciado, limpieza con hidrolimpiadora, llenado y puesta a punto de la Fuente ornamental de la Entrada






Tratamientos fitosanitarios contra malas hierbas en Vial Principal, Parque junto a Caseta Vigilancia, Parque alargado en Vial B, Pinada frente Hotel, ...





Tratamientos fitosanitarios contra pulgón en setos y ficus de alineación en Vial Principal

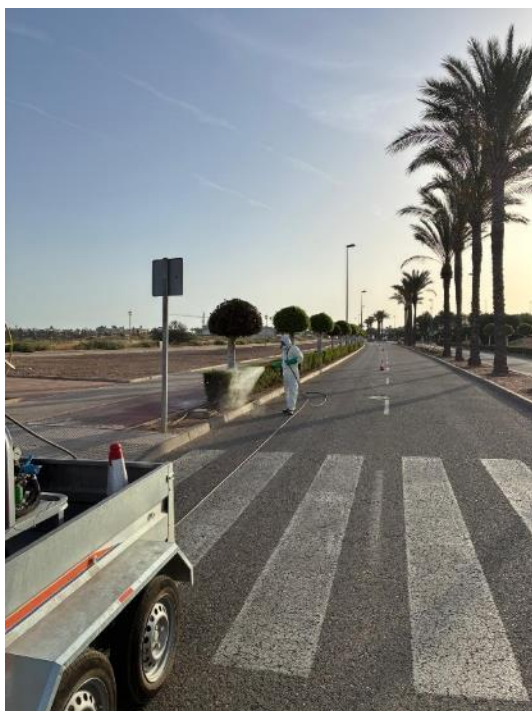



Siega de césped de la entrada, el jardín por cuadros, la rotonda de la entrada, rotonda de la Fase 6 y rotonda de la Fase 1:



Controles semanales y mensuales de los niveles de temperatura, pH y Cloro en instalaciones susceptibles de proliferación de Legionella (fuente ornamental, riego por aspersión y depósitos)



Revisión de la red de riego, abriendo arquetas y comprobando programadores, electroválvulas y puntos de emisión, detectando y reparando cada una de las incidencias detectadas en las siguientes ubicaciones:



Entrada - Jardín por Cuadros (reposición 1 programador Rain Bird por Solem 2E)



Entrada - Jardín por Cuadros (reposición 3 ml PE Ø32, 2 enlaces)



Entrada - Jardín por Cuadros (reposición resto jardín con 7 programadores SOLEM nuevos)



Entrada - Jardín por Cuadros (reposición resto jardín con 7 programadores SOLEM nuevos)



Entrada - Jardín por Cuadros (reposición resto jardín con 7 programadores SOLEM nuevos)



Entrada - Jardín por Cuadros (reposición resto jardín con 7 programadores SOLEM nuevos)



**Fase 6 - Jardín C/ Guinea (reparación fuga
0,5 ml PE Ø16, 2 enlaces)**



**Fase 6 - Jardín Olivos B (reparación anillo 2
ml PE Ø16, 2 enlaces, 2 goteros)**



**Fase 6 - Jardín Olivos B (reparación anillo 2
ml PE Ø16, 2 enlaces, 2 goteros)**



**Vial Ppal. - Jardín C/ Vistas Green
(reposición 70 ml PE Ø16, 6 enlaces)**



**Vial Ppal. - Jardín C/ Vistas Green
(reposición 70 ml PE Ø16, 6 enlaces)**



**Vial Ppal. - Pistas Dep. (reparación 2 ml PE
Ø32, 2 enlaces)**



Vial Ppal. Izq.- Mantenimiento (reposición programador Solem roto por nuevo SOLEM)



Vial Ppal. Dcha.- Mantenimiento (reposición programador Rain Bird por nuevo SOLEM)



Fase 6 - Olivos A (reparación tubería rajada vieja 23 ml PE Ø16, 6 enlaces)



Fase 6 - Olivos A (reparación tubería 10 ml PE Ø32, 4 enlaces)
